


ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES PRECEDENTES	DURACIÓN (DIAS)
A	Excavación	---	2
B	Cimientos	A	4
C	Obra negra	B	10
D	Plomería exterior	C	4
E	Colado	C	6
F	Instalaciones eléctricas	C	7
G	Plomería interior	D	5
H	Paredes exteriores	E	7
I	Revoque	G, F	8
J	Pintura exterior	H, D	9
K	Pisos	I	4
L	Pintura interior	I	5
M	Decoración exterior	J	6
N	Decoración interior	L, K, M	2

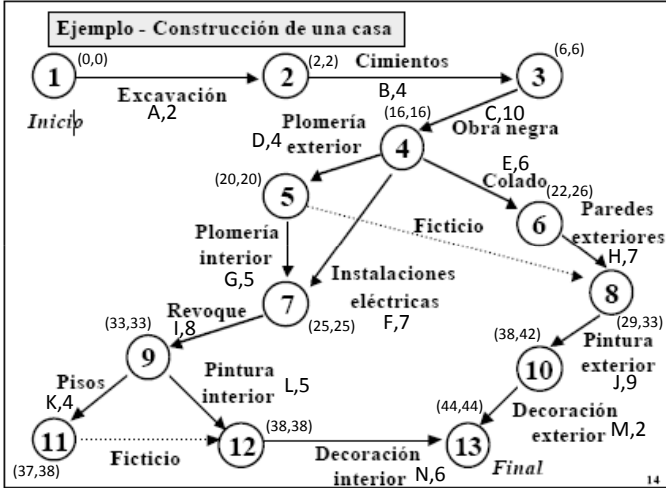

RUTA CRITICA		
ACTIVIDAD	Lj - Ei - tij	HOLGURA
A: (1, 2)	2 - 0 - 2	0
B: (2, 3)	6 - 2 - 4	0
C: (3, 4)	16 - 6 - 10	0
C: (4, 5)	20 - 16 - 4	0
C: (4, 6)	26 - 16 - 6	4
C: (4, 7)	25 - 16 - 7	2
C: (5, 7)	25 - 20 - 5	0
C: (6, 8)	33 - 22 - 7	4
C: (7, 9)	33 - 25 - 8	0
C: (8, 10)	42 - 29 - 9	4
C: (9, 11)	38 - 33 - 4	1
C: (9, 12)	38 - 33 - 5	0
C: (10, 13)	44 - 38 - 2	2
C: (12, 13)	44 - 38 - 6	0

EVENTO (j)	EVENTO ANTERIOR (i)	TIEMPO MAS PRÓXIMO (Ei)	DURACIÓN ACTIVIDAD Tij	Ej	Max(Ej)
1	--		--		
2	1	0	2	2	2
3	2	2	4	6	6
4	3	6	10	16	16
5	4	16	4	20	24
6	4	16	6	22	28
7	4	16	7	23	25
	5	20	5	25	
8	6	22	7	29	29
	5	20	0	20	
9	7	25	8	33	33
10	8	29	9	38	38
11	9	33	4	37	37
12	9	33	5	38	34
	11	37	0	37	
13	10	38	6	44	44
	12	40	2	42	

EVENTO (i)	EVENTO SIGUIENTE (j)	TIEMPO MAS LEJANO (Lj)	DURACIÓN ACTIVIDAD Tij	Li	Min(Li)
13	--				44
12	13	44	6	38	38
11	12	38	0	38	38
10	13	44	2	42	42
9	11	38	4	34	33
	12	38	5	33	
8	10	42	9	33	33
6	8	33	7	26	26
7	9	33	8	25	25
6	8	33	7	26	26
5	7	25	5	20	20
	8	33	0	33	
4	5	20	4	16	16
	7	25	7	18	
	6	26	6	20	
3	4	16	10	6	6
2	3	6	4	2	2
1	2	2	2	0	0
