Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Analyse**	**46 Tage**	**Di 21.07.98**	**Di 22.09.98**
2	**QST**	**39 Tage**	**Di 21.07.98**	**Fr 11.09.98**
3	SLD16	35 Tage	Di 21.07.98	Mo 07.09.98
4	SL64	30 Tage	Mo 03.08.98	Fr 11.09.98
5	SMA16	35 Tage	Mo 27.07.98	Fr 11.09.98
6	**QD2**	**46 Tage**	**Di 21.07.98**	**Di 22.09.98**
7	WL8/WTT8	20 Tage	Fr 31.07.98	Do 27.08.98
8	SMA4	20 Tage	Di 21.07.98	Mo 17.08.98
9	SMA1K	25 Tage	Fr 07.08.98	Do 10.09.98
10	SLR16	15 Tage	Mi 02.09.98	Di 22.09.98
11	Zulieferung Systemdesign GEM	0 Tage	Mo 31.08.98	Mo 31.08.98
12	Zulieferung StP-Sharing Konzept	0 Tage	Mi 19.08.98	Mi 19.08.98
13	Zulieferung GEM-Interface FM	0 Tage	Mi 30.09.98	Mi 30.09.98
14	Zulieferung GEM-Interface PM	0 Tage	Mo 02.11.98	Mo 02.11.98
15	Installation StP	15 Tage	Mi 29.07.98	Di 18.08.98
16	Zulieferung Repository Synch. Verfahren	0 Tage	Mo 21.12.98	Mo 21.12.98
17	**Sytem-/Detaildesign**	**130 Tage**	**Mi 19.08.98**	**Di 02.03.99**
18	Erst. Statisches Modell QST/QD2	58 Tage	Mi 19.08.98	Fr 06.11.98
19	Review SM	11 Tage	Mo 09.11.98	Mo 23.11.98
20	externes Review SM	0 Tage	Mo 23.11.98	Mo 23.11.98
21	Überarb. n. ext. Review	30 Tage	Di 24.11.98	Mo 18.01.99
22	Freigabe SD	0 Tage	Fr 05.02.99	Fr 05.02.99
23	Aufgabendef. QD2-Lib	5 Tage	Do 05.11.98	Mi 11.11.98
24	Modellierung QD2-Lib	25 Tage	Do 12.11.98	Fr 18.12.98
25	Review QD2-Lib	8 Tage	Mo 21.12.98	Mo 11.01.99
26	Erstellung Detaildesign	65 Tage	Mo 19.10.98	Fr 29.01.99
27	Abstimmung der GEM-SST	15 Tage	Mi 16.12.98	Fr 15.01.99
28	Überarbeitung SM	15 Tage	Mo 18.01.99	Fr 05.02.99
29	Überarbeitung DD	20 Tage	Mo 18.01.99	Fr 12.02.99
30	Review Detaildes.	12 Tage	Mo 15.02.99	Di 02.03.99
31	Freigabe Detaildes.	0 Tage	Di 02.03.99	Di 02.03.99

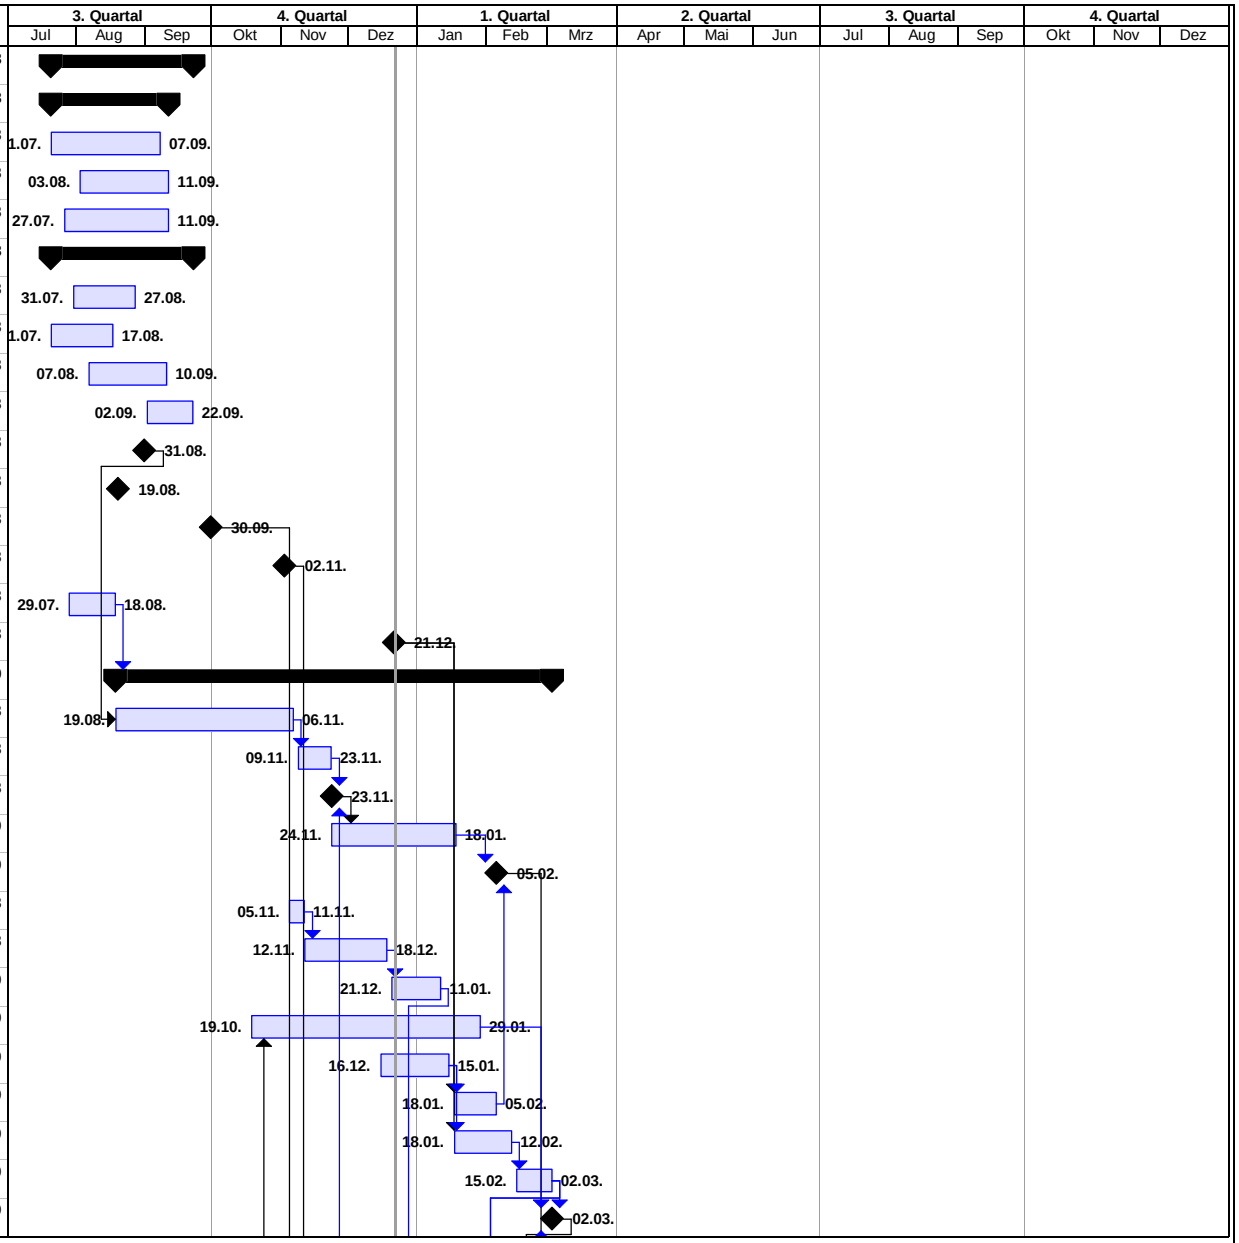

Projekt: SEM_A_02
Datum: Di 22.12.98

Vorgang		Sammelvorgang		Rullup in Arbeit		Unterbrechung	
In Arbeit		Rollup-Vorgang		Externe Vorgänge		Rollup-Unterbrechung	
Meilenstein		Rollup-Meilenstein		Projekt-Sammelvorgang			

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
32	Modellierung TH	34 Tage	Mo 19.10.98	Do 03.12.98
33	Review TH	21 Tage	Mi 09.12.98	Mo 18.01.99
34	Lieferung TNMS-SD V3	0 Tage	Mo 02.11.98	Mo 02.11.98
35	Review TNMS-SD (V3)	15 Tage	Di 03.11.98	Mo 23.11.98
36	Einarbeitung FM/PM	13 Tage	Do 05.11.98	Mo 23.11.98
37	Meilenstein Systemdesign / M230	0 Tage	Di 02.03.99	Di 02.03.99
38	Zulieferung Developers Handbook	0 Tage	Di 15.09.98	Di 15.09.98
39	Zulieferung BOSS Interface	0 Tage	Do 15.10.98	Do 15.10.98
40	Zulieferung Stack Interface	0 Tage	Fr 04.12.98	Fr 04.12.98
41	Zulieferung QST-Library	0 Tage	Do 15.10.98	Do 15.10.98
42	Vorbereitung Implementierung	20 Tage	Do 05.11.98	Mi 02.12.98
43	**Implementierung**	**145 Tage**	**Mi 09.12.98**	**Mo 19.07.99**
44	TH	35 Tage	Mi 09.12.98	Fr 05.02.99
45	2. Drop QST	47 Tage	Mi 10.02.99	Fr 16.04.99
46	QD2-Lib	45 Tage	Mo 04.01.99	Mo 08.03.99
47	2. Drop QD2	48 Tage	Mi 10.02.99	Mo 19.04.99
48	3. Drop QST	33 Tage	Mo 10.05.99	Mi 30.06.99
49	3. Drop QD2	40 Tage	Do 20.05.99	Mo 19.07.99
50	Meilenstein Implementierung / M320	0 Tage	Mo 19.07.99	Mo 19.07.99
51	Zulieferung Stack-SW	0 Tage	Mo 01.02.99	Mo 01.02.99
52	**Klassentest**	**139 Tage**	**Mo 08.02.99**	**Fr 27.08.99**
53	TH	30 Tage	Mo 08.02.99	Fr 19.03.99
54	2. Drop QST	35 Tage	Mo 19.04.99	Fr 11.06.99
55	QD2-Lib	35 Tage	Di 09.03.99	Di 27.04.99
56	2. Drop QD2	40 Tage	Di 20.04.99	Mo 21.06.99
57	3. Drop QST	30 Tage	Do 01.07.99	Mi 11.08.99
58	3. Drop QD2	29 Tage	Di 20.07.99	Fr 27.08.99
59	Meilenstein Klassentest/M335	0 Tage	Fr 27.08.99	Fr 27.08.99
60	Zulieferung GEM 2. Drop	0 Tage	Mi 31.03.99	Mi 31.03.99
61	Zulieferung GEM 3. Drop	0 Tage	Mi 30.06.99	Mi 30.06.99
62	Zulieferung der NE-SIM	0 Tage	Mo 01.03.99	Mo 01.03.99

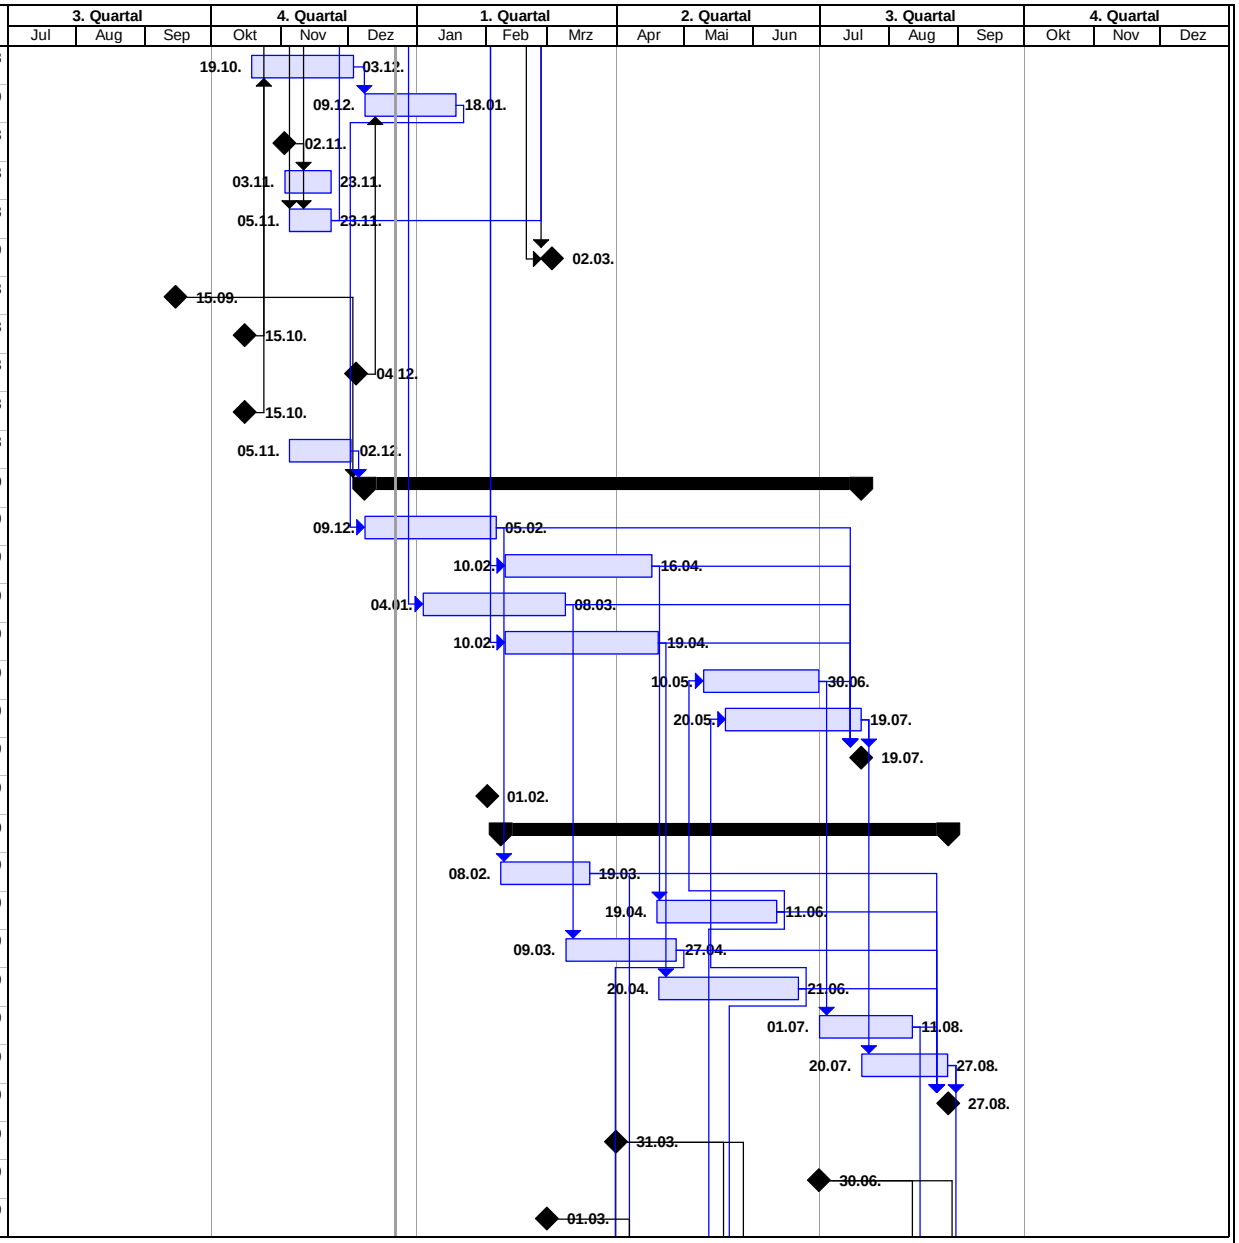

Projekt: SEM_A_02
Datum: Di 22.12.98

Vorgang		Sammelvorgang		Rullup in Arbeit		Unterbrechung	
In Arbeit		Rollup-Vorgang		Externe Vorgänge		Rollup-Unterbrechung	
Meilenstein		Rollup-Meilenstein		Projekt-Sammelvorgang			

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
63	Vorbereitung INT-Test	45 Tage	Mi 09.12.98	Fr 19.02.99
64	**Integration**	**123 Tage**	**Mi 07.04.99**	**Fr 01.10.99**
65	TH	30 Tage	Mi 07.04.99	Do 20.05.99
66	2. Drop QST	45 Tage	Mi 19.05.99	Fr 23.07.99
67	2. Drop QD2	50 Tage	Fr 28.05.99	Mo 09.08.99
68	3. Drop QST	25 Tage	Do 12.08.99	Mi 15.09.99
69	3. Drop QD2	25 Tage	Mo 30.08.99	Fr 01.10.99
70	Meilenstein Integration/M350	0 Tage	Fr 01.10.99	Fr 01.10.99
71	Lieferung QST 2. Drop	0 Tage	Fr 23.07.99	Fr 23.07.99
72	Lieferung QD2 2. Drop	0 Tage	Mo 09.08.99	Mo 09.08.99
73	Lieferung QST 3. Drop	0 Tage	Mi 15.09.99	Mi 15.09.99
74	Lieferung QD2 3. Drop	0 Tage	Fr 01.10.99	Fr 01.10.99
75	Zulieferung WTT8	0 Tage	Mo 17.05.99	Mo 17.05.99
76	Zulieferung SLD16	0 Tage	Mo 17.05.99	Mo 17.05.99
77	Zulieferung SL64	0 Tage	Mo 17.05.99	Mo 17.05.99
78	Zulieferung SMA4	0 Tage	Mo 17.05.99	Mo 17.05.99
79	Zulieferung SMA1K	0 Tage	Mo 17.05.99	Mo 17.05.99
80	Zulieferung SLR16	0 Tage	Mo 17.05.99	Mo 17.05.99
81	Zulieferung WL8	0 Tage	Mo 17.05.99	Mo 17.05.99
82	Vorbereitung Systemtest	84 Tage	Mo 01.03.99	Fr 02.07.99
83	**Systemtest**	**104 Tage**	**Mo 19.07.99**	**Mi 15.12.99**
84	2. Drop SLD	50 Tage	Mo 19.07.99	Fr 24.09.99
85	2. Drop SL64	50 Tage	Mo 19.07.99	Fr 24.09.99
86	2. Drop SLR	40 Tage	Di 10.08.99	Mo 04.10.99
87	2. Drop SMA4	55 Tage	Di 10.08.99	Mi 27.10.99
88	2. Drop SMA1K	45 Tage	Di 10.08.99	Mo 11.10.99
89	2. Drop WL8	40 Tage	Di 10.08.99	Mo 04.10.99
90	2. Drop WTT8	40 Tage	Di 10.08.99	Mo 04.10.99
91	3. Drop SLD	39 Tage	Do 16.09.99	Fr 12.11.99
92	3. Drop SL64	39 Tage	Do 16.09.99	Fr 12.11.99
93	3. Drop SLR	29 Tage	Mo 04.10.99	Di 16.11.99

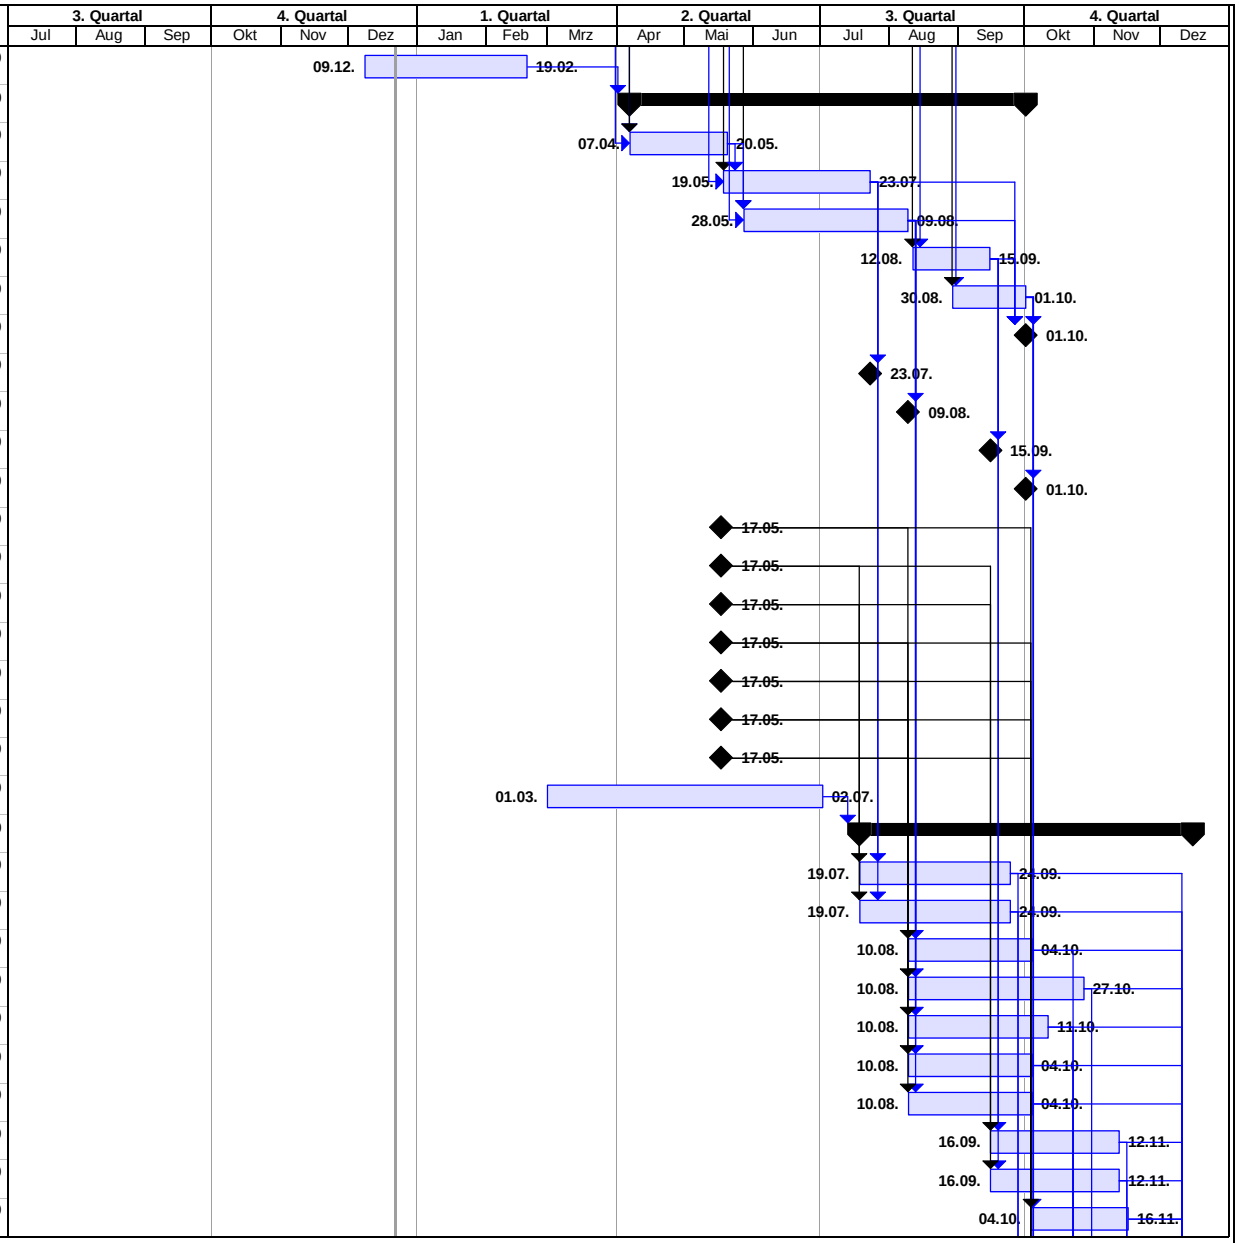

Projekt: SEM_A_02
Datum: Di 22.12.98

Vorgang	Sammelvorgang	Rullup in Arbeit	Unterbrechung
In Arbeit	Rollup-Vorgang	Externe Vorgänge	Rollup-Unterbrechung
Meilenstein	Rollup-Meilenstein	Projekt-Sammelvorgang	

Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
94		3. Drop SMA4	49 Tage	Mo 04.10.99	Mi 15.12.99
95		3. Drop SMA1K	34 Tage	Mo 04.10.99	Di 23.11.99
96		3. Drop WL8	34 Tage	Mo 04.10.99	Di 23.11.99
97		3. Drop WTT8	34 Tage	Mo 04.10.99	Di 23.11.99
98		Lieferung SEM QST 2.Drop	0 Tage	Fr 24.09.99	Fr 24.09.99
99		Lieferung SEM QST 3.Drop	0 Tage	Fr 12.11.99	Fr 12.11.99
100		Lieferung SEM QD2 2. Drop	0 Tage	Mi 27.10.99	Mi 27.10.99
101		Lieferung SEM QD2 3. Drop	0 Tage	Mi 15.12.99	Mi 15.12.99
102		Meilenstein Systemtest /M360	0 Tage	Mi 15.12.99	Mi 15.12.99

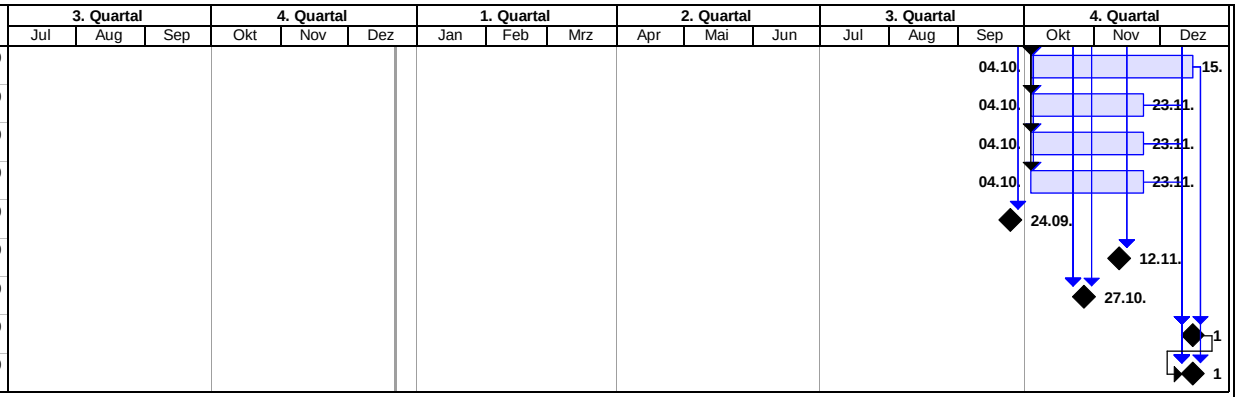

Projekt: SEM_A_02
Datum: Di 22.12.98

Vorgang		Sammelvorgang		Rullup in Arbeit		Unterbrechung	
In Arbeit		Rollup-Vorgang		Externe Vorgänge		Rollup-Unterbrechung	
Meilenstein		Rollup-Meilenstein		Projekt-Sammelvorgang			
